


Anlage 8 zur DS 118/23 - Projektterminplan; Stand 18.08.2023

Datei: 230731_FKM_TP_Projektterminplan1-4.PPL

Seite 1 von 5

ENTWURF PROJEKTTERMINPLAN - Stand VgV-Verfahren

FKM_Neubau Feuerwache Kleinmachnow

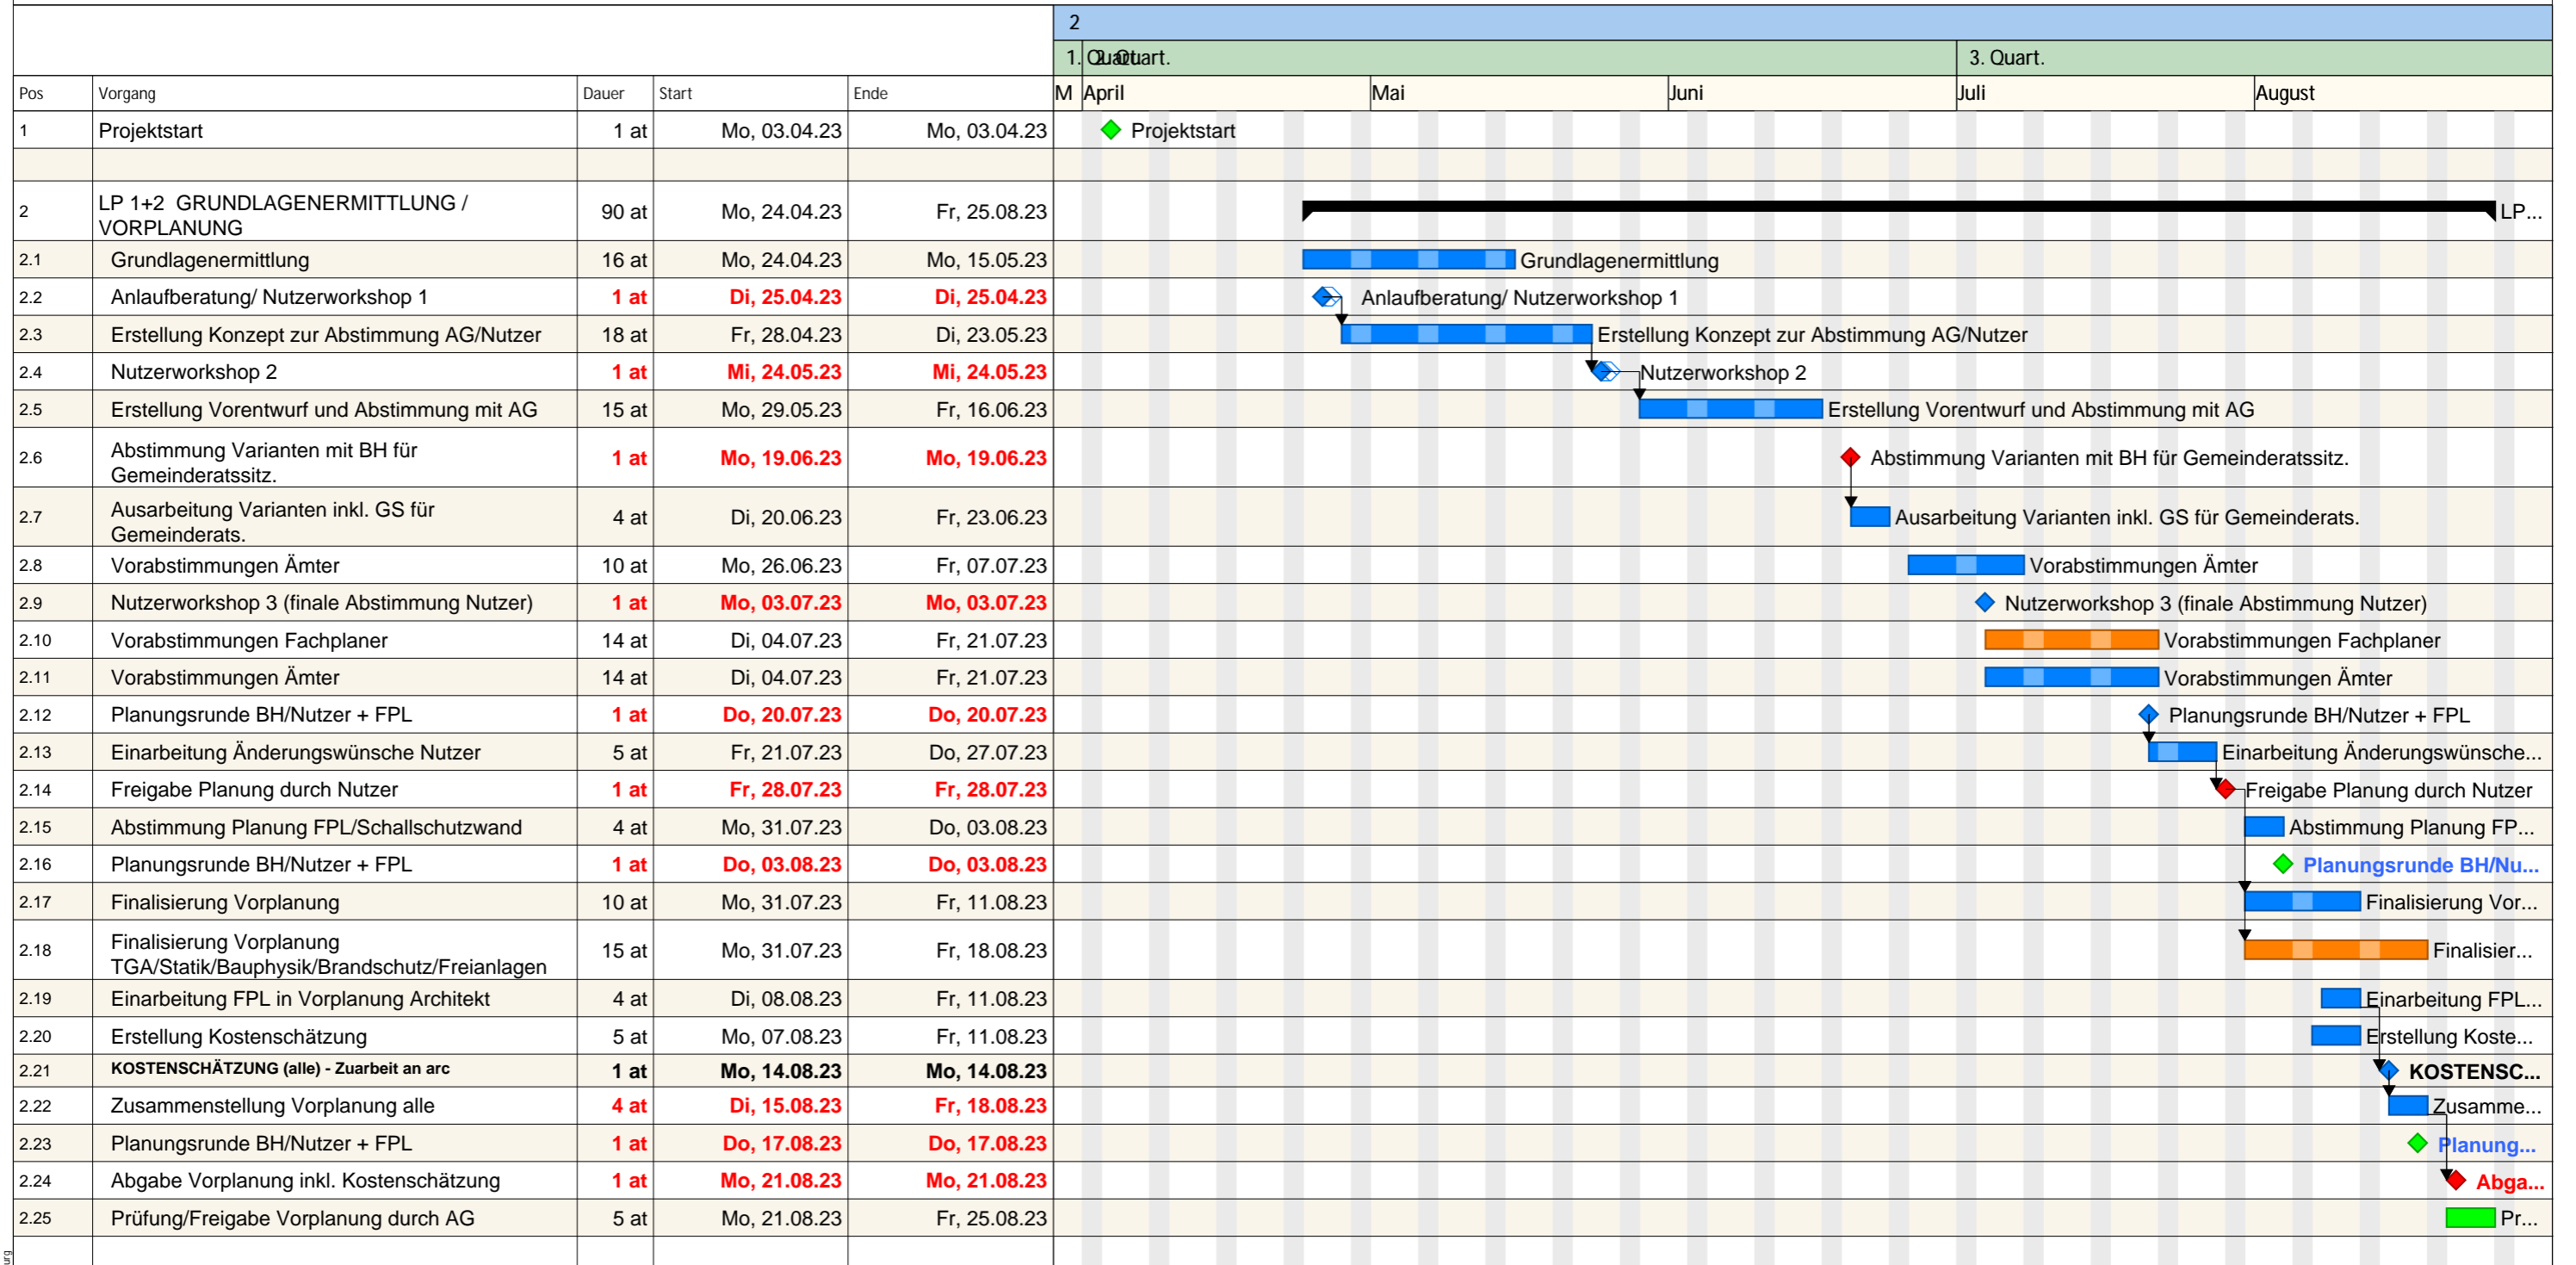

erstellt mit proPlan 7 (7.0.0.21) - Serien Nr.: 87 - Lizenz für ARC Projektmanagement, Magdeburg


Projektzeiträumen von Mi, 01.02.23 bis Do, 31.12.26
 Kalender: Sachsen-Anhalt (eingebettet)
 Druckdatum: 18.08.2023 10:02
 Filter:

- Leistungen Bauherr
- Leistungen Architekt
- Leistungen Fachplanung
- Leistungen TGA-Planung
- Zeitpuffer
- Leistung Tragwerksplanung
- Leistungen Außenanlagen

arc architekturconcept GmbH
 Zum Domfelsen 1
 39104 Magdeburg
 e-Mail: info@arc-architektur.de

ENTWURF PROJEKTTERMINPLAN - Stand VgV-Verfahren

FKM_Neubau Feuerwache Kleinmachnow

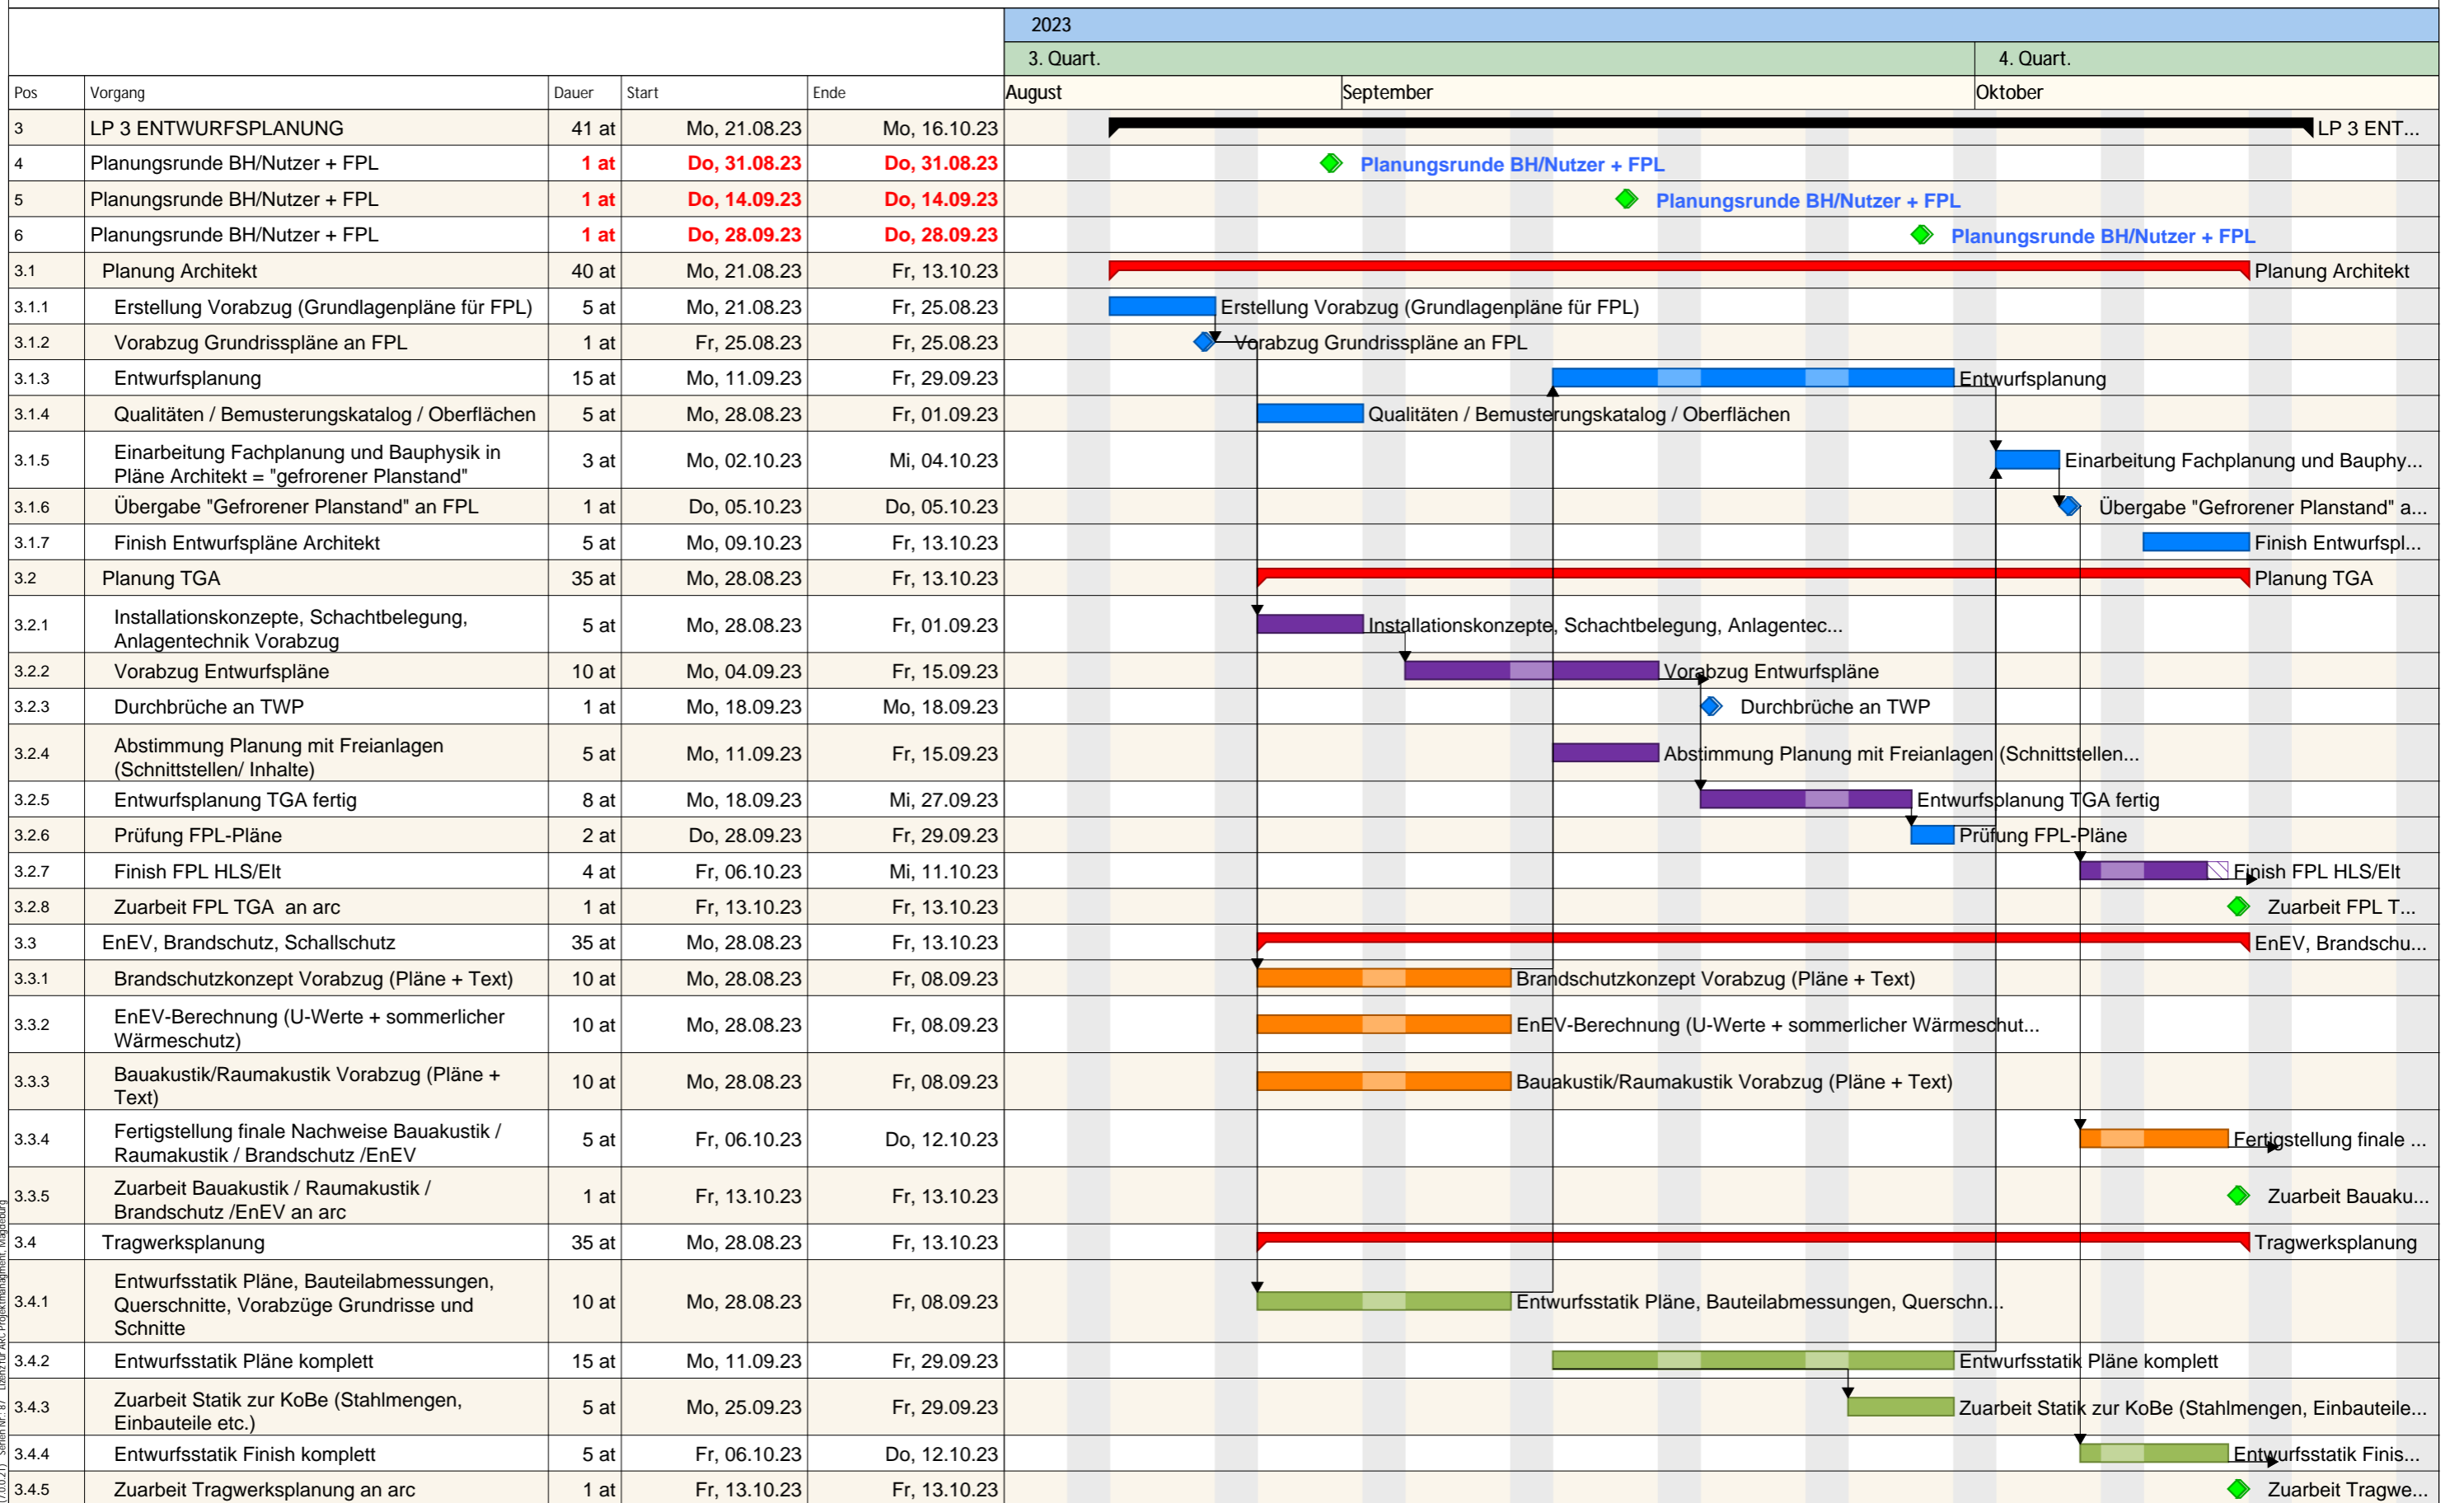

erstellt mit proPlan 7 (7.0.0.21) - Serien-Nr.: 87 - Lizenz für ARC Projektmanagement, Magdeburg

Projektzeitrahmen von Mi, 01.02.23 bis Do, 31.12.26
 Kalender: Sachsen-Anhalt (eingebettet)
 Druckdatum: 18.08.2023 10:02
 Filter:

■ Leistungen Bauherr	■ Leistungen TGA-Planung	■ Leistungen Außenanlagen
■ Leistungen Architekt	 Zeitpuffer	
■ Leistungen Fachplanung	■ Leistung Tragwerksplanung	

arc architekturconcept GmbH
 Zum Domfelsen 1
 39104 Magdeburg
 e-Mail: info@arc-architektur.de

ENTWURF PROJEKTTERMINPLAN - Stand VgV-Verfahren


FKM_Neubau Feuerwache Kleinmachnow

					2023			
					3. Quart.		4. Quart.	
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	August	September	Oktober	November
3.5	Freianlagen	35 at	Mo, 28.08.23	Fr, 13.10.23				
3.5.1	Erstellung Vorabzug Freianlagenplanung	10 at	Mo, 28.08.23	Fr, 08.09.23				
3.5.2	Abstimmung Planung mit TGA (Schnittstellen/ Inhalte)	5 at	Mo, 11.09.23	Fr, 15.09.23				
3.5.3	Freianlagenplanung Finish komplett	20 at	Mo, 18.09.23	Fr, 13.10.23				
3.5.4	Zuarbeit Freianlagenplanung an arc	1 at	Fr, 13.10.23	Fr, 13.10.23				
3.6	Erläuterungen / Kosten / Flächenberechnungen	25 at	Mo, 11.09.23	Fr, 13.10.23				
3.6.1	Erl.Bericht Architektur zur Abst. BH	10 at	Mo, 11.09.23	Fr, 22.09.23				
3.6.2	Erl.Bericht TGA zur Abst. BH	10 at	Mo, 18.09.23	Fr, 29.09.23				
3.6.3	KoBe KG 300 + 500 vorab	10 at	Mo, 25.09.23	Fr, 06.10.23				
3.6.4	KoBE KG 200 + 400 vorab	10 at	Mo, 25.09.23	Fr, 06.10.23				
3.6.5	Erl. Berichte KG 300 + 400 final	5 at	Mo, 02.10.23	Fr, 06.10.23				
3.6.6	Flächenberechnungen final	4 at	Mo, 09.10.23	Do, 12.10.23				
3.6.7	Finish Kostenberechnung KG 200 - 500	4 at	Mo, 09.10.23	Do, 12.10.23				
3.6.8	KOSTENKONTROLLE - KOSTENBERECHNUNG	1 at	Fr, 13.10.23	Fr, 13.10.23				
3.7	Finish Entwurfsplanung	2 at	Fr, 13.10.23	Mo, 16.10.23				
3.7.1	Zusammenstellung/Finish Entwurfsplanung	1 at	Fr, 13.10.23	Fr, 13.10.23				
3.7.2	Übergabe Entwurfsplanung an AG	1 at	Mo, 16.10.23	Mo, 16.10.23				
7	Prüfung/Freigabe Entwurfsplanung durch AG	29 at	Di, 17.10.23	Fr, 24.11.23				

erstellt mit proPlan 7 (7.0.0.21) - Serien Nr.: 87 - Lizenz für ABC Projektmanagement, Magdeburg

ENTWURF PROJEKTTERMINPLAN - Stand VgV-Verfahren

FKM_Neubau Feuerwache Kleinmachnow

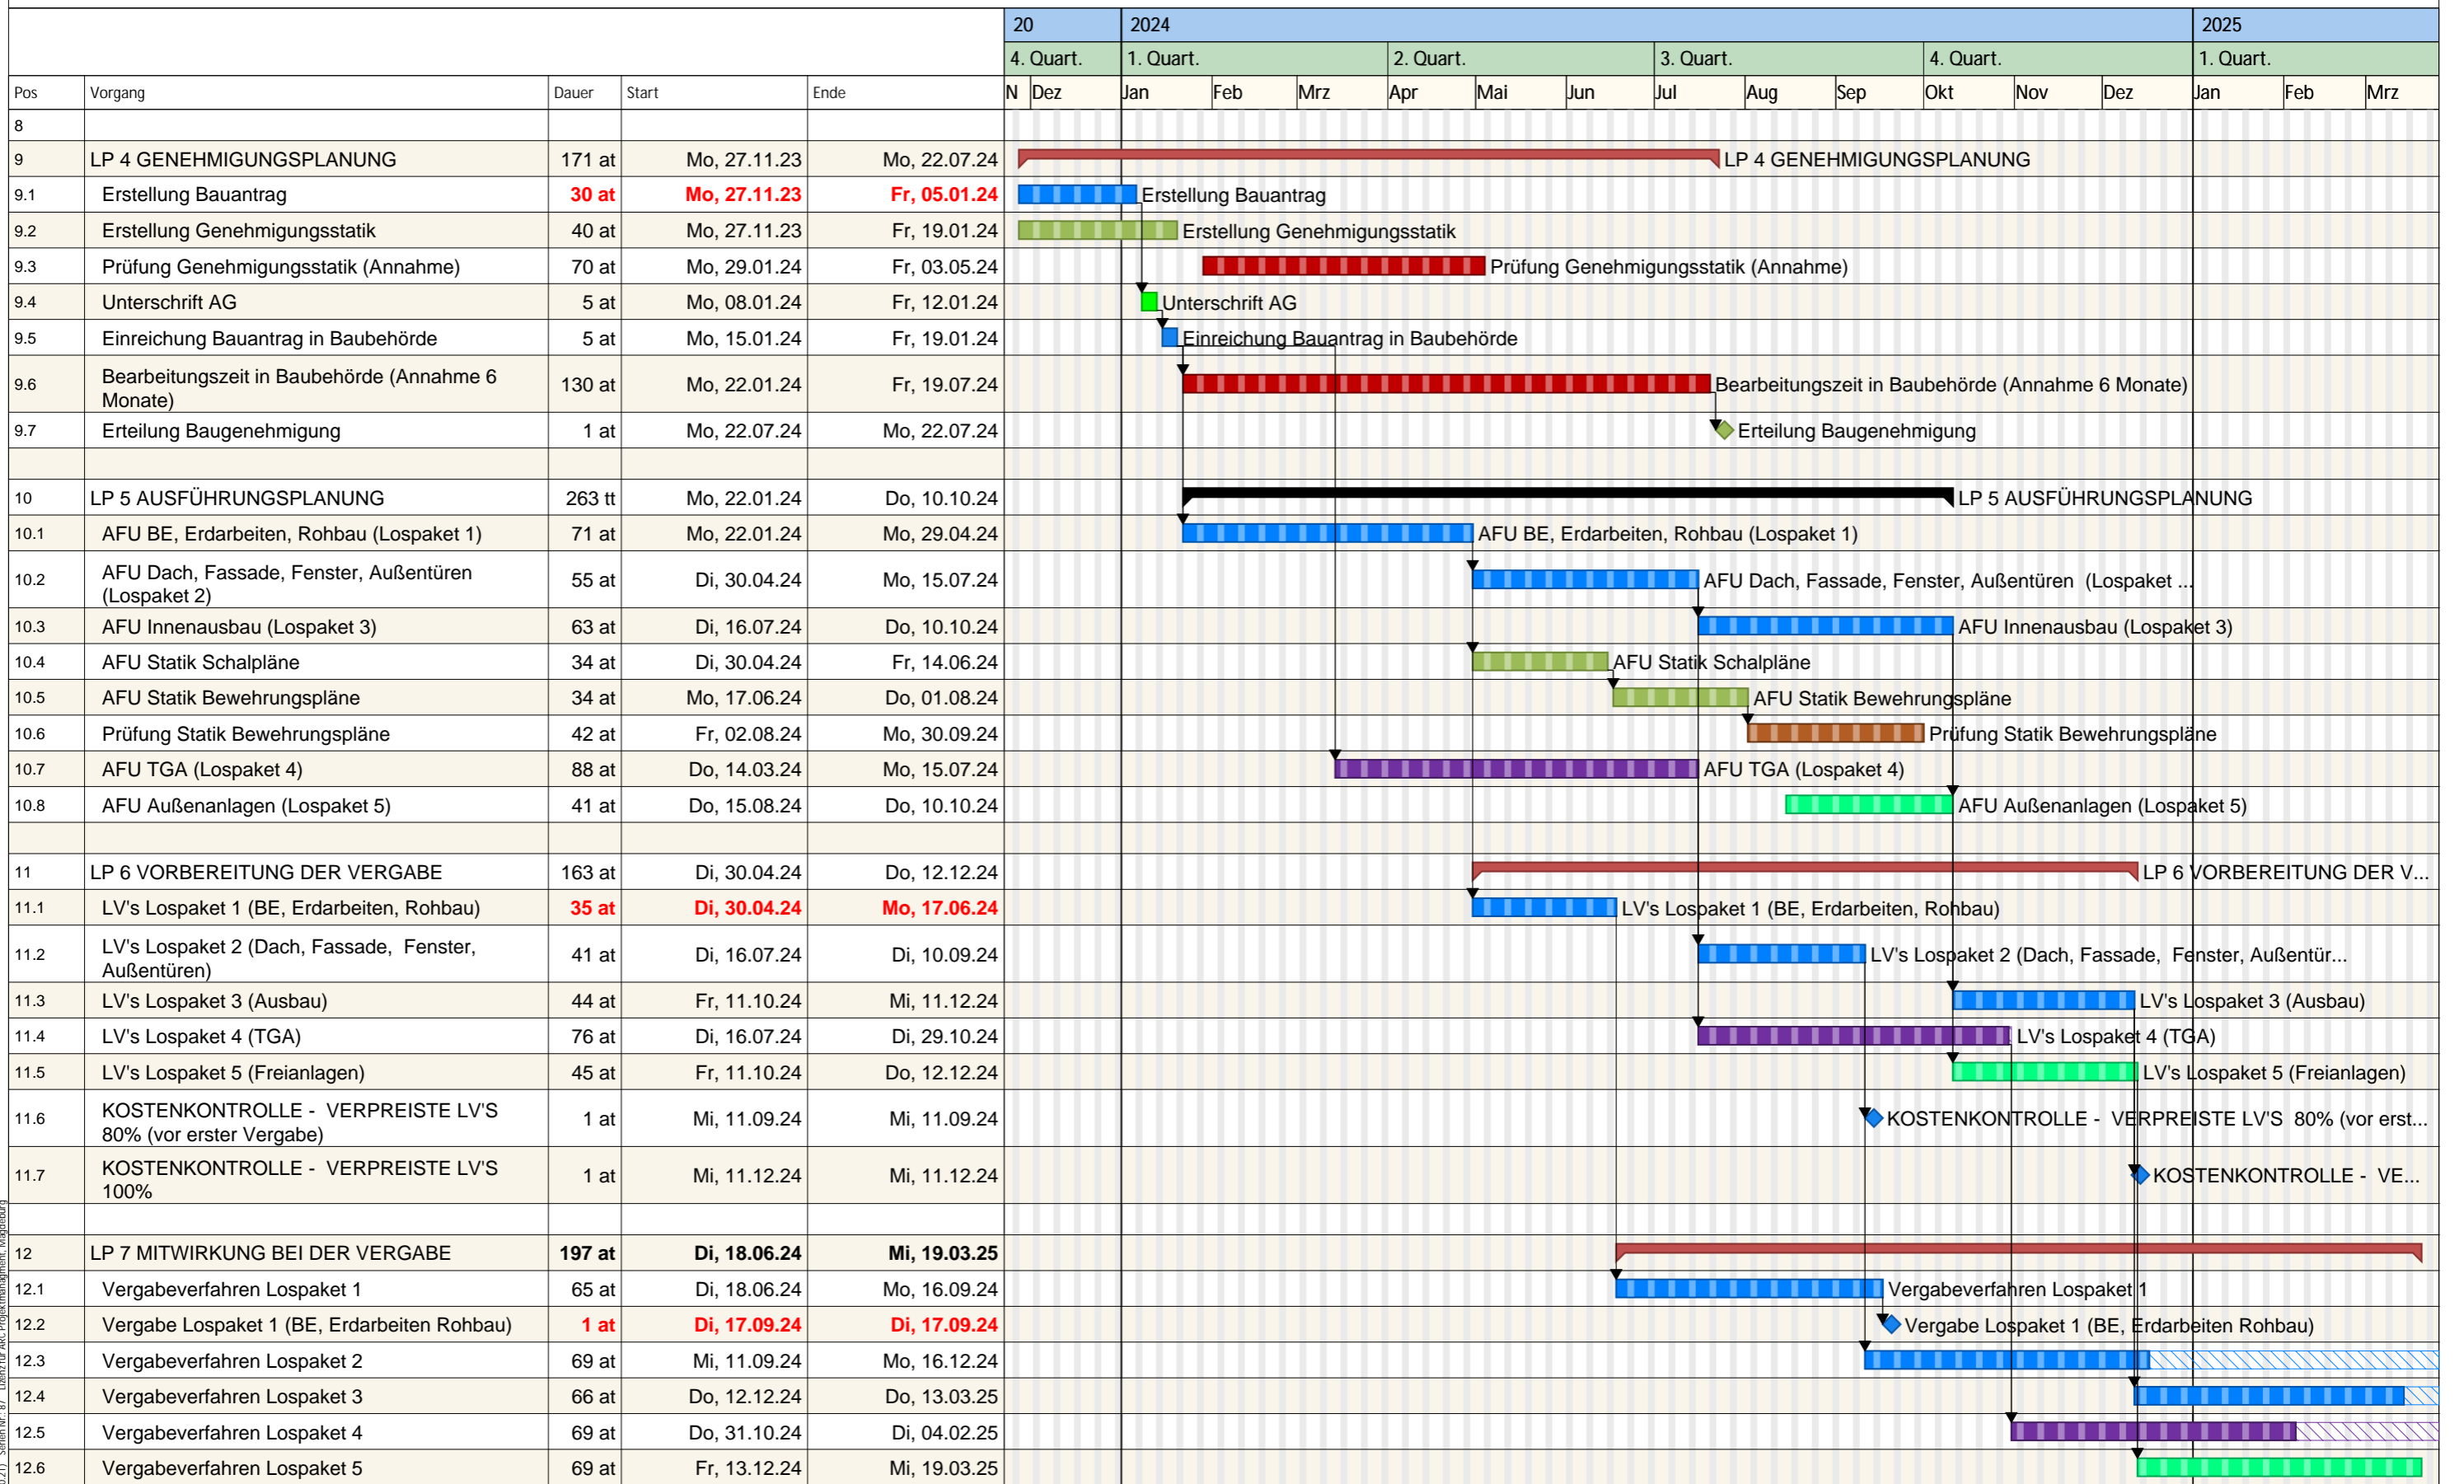

Projektzeiträumen von Mi, 01.02.23 bis Do, 31.12.26
 Kalender: Sachsen-Anhalt (eingebettet)
 Druckdatum: 18.08.2023 10:02
 Filter:

Leistungen Bauherr	Leistungen TGA-Planung	Leistungen Außenanlagen
Leistungen Architekt	Zeitpuffer	
Leistungen Fachplanung	Leistung Tragwerksplanung	

arc architekturconcept GmbH
 Zum Domfelsen 1
 39104 Magdeburg
 e-Mail: info@arc-architektur.de

erstellt mit pro-plan 7 (7.0.21) - Serien-Nr.: 87 - Lizenz für ABC-Projektmanagement, Magdeburg

ENTWURF PROJEKTTERMINPLAN - Stand VgV-Verfahren

FKM_Nebau Feuerwehrwache Kleinmachnow

					2024			2025												2026									
					4. Quart.			1. Quart.			2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.			1. Quart.			2. Quart.			3. Quart.			
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul			
13																													
14	LP 8 BAUÜBERWACHUNG (1.BA)	481 at	Mo, 07.10.24	Mo, 10.08.26	[Red bar spanning from Oct 2024 to Jul 2026]																								
15	Projektende	1 at	Di, 07.07.26	Di, 07.07.26																							◆ Proj...		

erstellt mit pro-plan 7 (7.0.0.21) - Serien-Nr.: 87 - Lizenz für ABC Projektmanagement, Magdeburg

Projektzeiträumen von Mi, 01.02.23 bis Do, 31.12.26
 Kalender: Sachsen-Anhalt (eingebettet)
 Druckdatum: 18.08.2023 10:02
 Filter:

- Leistungen Bauherr
- Leistungen Architekt
- Leistungen Fachplanung
- Leistungen TGA-Planung
- ▨ Zeitpuffer
- Leistung Tragwerksplanung
- Leistungen Außenanlagen

arc architekturconcept GmbH
 Zum Domfelsen 1
 39104 Magdeburg
 e-Mail: info@arc-architektur.de
